

**Informacja pokontrolna**  
**przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.**  
**„Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej”**  
**realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego.**

**Jednostka kontrolowana: Komenda Powiatowa**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Kazimierzy Wielkiej**  
**ul. Sienkiewicza 21**  
**28-500 Kazimierza Wielka**

W dniu 4÷5 października 2010 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego nr 17/2010 z dnia 29 września 2010 r. w składzie:

1. Pani Jolanta Rybka – Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Kierownik Zespołu,
2. Pani Beata Jakubowska – Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
3. Pani Emilia Machul-Frelik – Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
4. Pan Radosław Kowalski – Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

przeprowadzili kontrolę, której celem była rzeczowa ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu przez Beneficjenta.

**Zakres kontroli obejmował:**

- prawidłowość wydatkowania przeznaczonych na inwestycję środków finansowych z budżetu państwa w 2008r., 2009r. i 2010r.
- poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),
- potwierdzenie fizycznej realizacji projektu.

**Beneficjenta reprezentowali:**

1. Pan Mirosław Ciepela – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej,
2. Pani Aneta Kowalska - Główny Księgowy PSP w Kazimierzy Wielkiej,
3. Pan Andrzej Krupa - Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej w PSP w Kazimierzy Wielkiej,

W dniu 27 listopada 2006r. w wyniku przeprowadzonych wyborów na Starostę Kazimierskiego został wybrany Pan Jan Nowak.

Z dniem 1 marca 2005r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Pan Mirosław Ciepiela.

[Dowód: akta kontroli karty: 1– 2]

Wydział Finansowo – Budżetowy Powiatu Kazimierskiego uchwałą Rady Powiatu Nr 2/5/2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku zabezpieczył środki na ww inwestycję w dz. 754 rozdz. 75411 § 6050 w wysokości 30 000,00 zł ( zmniejszenie o 928,00 zł ).

Wydział Finansowo – Budżetowy Powiatu Kazimierskiego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/39/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku zabezpieczył środki na ww inwestycję w dz. 754 rozdz. 75411 § 6050 w wysokości 100 000,00zł ( zwiększenie o 95 200,00zł ).

Wydział Finansowo – Budżetowy Powiatu Kazimierskiego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/92/2008 z dnia 26 marca 2008 roku zabezpieczył środki na ww inwestycję w dz. 754 rozdz. 75411 § 6050 w wysokości 1 509 000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/162/2009 z dnia 23 września 2009 roku został zmieniony plan finansowy na 2009 rok i zabezpieczono środki na ww inwestycję w dz. 754 rozdz. 75411 § 6050 w wysokości 600 000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 59/228/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku został zatwierdzony plan finansowy wydatków na 2010 rok w dz. 754 rozdz. 75411 § 6050 w wysokości 1 500 000,00zł.

[Dowód: akta kontroli karty: 3-24]

Rzeczowy zakres inwestycji realizowanej przez Powiatową Straż Pożarną w Kazimierzy Wielkiej obejmuje kompleksowe wykonanie budynku strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z opracowanym projektem architektoniczno- budowlanym na podstawie którego zostało wydane pozwolenie na budowę.

Uchwałą nr 10/23/2007 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 21 maja 2007 roku oraz na podstawie Decyzji Nr 1 z dnia 9 lipca 2007r., na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, ustanowiono prawo trwałego zarządu

nieruchomości niezabudowanej o pow. 1,8178 ha, położonej w Kazimierzy Wielkiej oznaczonej numerem 3025 w ewidencji gruntów miasta Kazimierza Wielka z przeznaczeniem pod budowę obiektów Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzją nr 171/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano Komendzie Powiatowej P.S.P w Kazimierzy Wielkiej ul. Sienkiewicza 21, 28-500 Kazimierza Wielka pozwolenie na budowę strażnicy P.S.P (kat. Obiektu XVI) wraz z budynkiem gospodarczym oraz infrastrukturą techniczną.

[Dowód: akta kontroli karty: 25-30]

Całość realizowanej inwestycji począwszy od 2006 roku do chwili obecnej jest finansowana w 100% z budżetu Wojewody.

[Dowód: akta kontroli karty: 259 ]

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin przekazania placu budowy został zachowany.

[Dowód: akta kontroli karty: 284]

Komplet dokumentów tj. umowa z wykonawcą, oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, dziennik budowy załączone zostały do niniejszej informacji.

[Dowód: akta kontroli karty: 260-264, 154-161]

Zestawienie faktur przedłożone do rozliczenia potwierdzające wydatkowanie środków w latach 2006-2010 ( ujęte na koncie „080”- inwestycje oraz „130” – rachunek bieżący i rozliczenia częściowego, które wpłynęło 26 marca 2010r. do WFEiPP ŚUW Kielce).

[Dowód: akta kontroli karty: 260-264, 154-161]

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu Beneficjenta wydatkowane w latach 2006÷2010 ze środków finansowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dokumenty w aktach Programu Inwestycyjnego).

Jak ustalono w toku kontroli, wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były opisywane i sprawdzane przez osoby upoważnione.

Konta „130” i „080” – zestawienie.

[Dowód: akta kontroli karty: 283]

**Zestawienie faktur przedłożone do weryfikacji nawiązujące do rozliczenia w latach 2006-2010  
( ujęte na koncie „080”- inwestycje i "130" - rachunek bieżący oraz rozliczenie częściowe)**

L.p.	Rok	Finansowanie w danym roku budżetowym	Nr faktury/ rachunku	Data wystawienia faktury	Wartość faktury	Data zapłaty	Kwota przelewu	Wykonanie
1	2006	19 995,80	160/2006	14.12.2006	8 540,00	27.12.2006	8 540,00	Dokumentacja geotechniczna do projektu budowy strażnicy KP PSP przy ul. Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej
2			15/2006	20.12.2006	11 455,80	28.12.2006	11 455,80	Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej Strażnicy PSP z JGR w Kazimierzy Wielkiej
3	2007	195 000,00	1/12/2007	20.12.2007	195 000,00	28.12.2007	195 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku strażnicy wraz z budynkiem gospodarczym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 3025 przy ul. Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej (umowa nr PT-2370/4/07)
4	2008	1 509 000,00	3/2008	17.01.2008	1 300,00	25.01.2008	1 300,00	Za opracowanie mapy do celów projektowych m. Kazimierza Wielka działka nr 3025
5			02/08/2008	04.08.2008	9 991,80	03.09.2008	9 991,80	Ekspertyza Geotechniczna w zakresie możliwości ograniczenia zakresu kosztów palowania pod obiektami strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej oraz uzupełnienie nr 1 do w/w ekspertyzy oraz badania dodatkowe do w/w ekspertyzy
6			09/12/2008	17.12.2008	1 497 708,20	30.12.2008	1 497 708,20	Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej (pale fundamentowe, roboty ziemne budynek główny - wykopy, podkłady pod fundamenty)
7	2009	600 000,00	2009/09/04	17.09.2009	398 571,73	15.10.2009	398 571,73	Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej (ławy i stopy fundamentowe, izolacja fundamentów - ław i ścian)
8			2009/10/02	19.10.2009	196 372,97	18.11.2009	196 372,97	Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej (Wykonanie podłoży z ubitych kruszyw pod posadzki, podkłady z chudych betonów, wzmocnienia gruntu pod posadzki w garażach)
9			29/MZ/2009	06.11.2009	5 055,30	20.11.2009	5 055,30	Za nadzór inwestorski nad budową Strażnicy dla Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej

10	2010	355 882,66	2010/08/05	17.08.2010	355 882,66	03.09.2010	355 882,66	Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej (konstrukcja żelbetonowa ścian - parter, konstrukcja murowa ścian - parter, strop nad parterem)
<b>Razem</b>		<b>2 679 878,46</b>			<b>2 679 878,46</b>		<b>2 679 878,46</b>	

## **2. Ocena zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym.**

Tematem przeprowadzonej kontroli była również zgodność realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

W oparciu o zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego Program Inwestycji pn. „Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej” została w latach 2006-2010 przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **2 679 878,46 zł.**

Powyższą kwotę wydatkowano następująco:

- w 2006 roku – 19 995,80 zł,
- w 2007 roku – 195 000,00 zł,
- w 2008 roku – 1 509 000,00 zł,
- w 2009 roku – 600 000,00 zł,
- w 2010 roku – 355 882,66 zł.

Planowanym efektem rzeczowym ( wizualizacja dołączona do protokołu ) jest oddanie do użytkowania nowoczesnego obiektu z wyposażeniem zapewniającym właściwe warunki do funkcjonowania Powiatowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Obiekt spełniając jednocześnie funkcje wymagane dla jednostki ratowniczo – gaśniczej pozwoli zabezpieczyć właściwie cały powiat kazimierski.

Harmonogram rzeczowy ww projekcie zgodnie z zaakceptowaną w listopadzie 2010r. aktualizacją Programu Inwestycyjnego, zrealizowany w latach 2008-2011 obejmuje swym zakresem:

- zorganizowanie zaplecza budowy ( I etap- woda, energia elektr.),
- wykopy pod drogi, place, budynki,
- roboty palowe i uzupełniające,
- budynek strażnicy,
- kanalizacja deszczowa,
- przyłącze i sieć wodociągowa,

Powyższy zakres harmonogramu rzeczowego potwierdzają ujęte w zestawieniu faktury, które wraz z umową zostały przedłożone w miejscu prowadzonej kontroli. Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były zgodne z ujętymi w przedłożonym do weryfikacji rozliczeniu dokumentów księgowo – finansowych. Wystawione faktury za roboty budowlane poparte zostały Protokołami Odbioru.

Zgodnie z harmonogramem finansowym Programu Inwestycyjnego planowany koszt realizacji zadania w 2006 -2011 wynosi **11 259 436,70 zł, z czego:**

- w 2006 roku – 19 995,80 zł,
- w 2007 roku – 195 000,00 zł,
- w 2008 roku – 1 509 000,00 zł,
- w 2009 roku – 600 000,00 zł,
- w 2010 roku - 1 500 000,00 zł,
- w 2011 roku – 7 435 440,90 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania pn. „Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej” podczas przeprowadzonej kontroli wykazała, że:

- w 2008 wydatkowano 1 509 000,00 zł,
- w 2009 wydatkowano 600 000,00 zł,
- w 2010 wydatkowano 355 882,66 zł.

Należy nadmienić, iż do wartości inwestycji zgodnie z Programem Inwestycyjnym uwzględniono również płatności faktur z 2006r. i 2007r., w kwocie ogółem **214 995,80zł.**

Zatem na dzień przeprowadzonej kontroli ogólny koszt inwestycji wyniósł **2 679 878,46 zł.**

Procentowy udział dotacji środków wydatkowanych w latach 2006r. – 2010r. do całkowitego planowanego kosztu inwestycji wyniósł **23,80 % ( 2 679 878,46/11 259 436,70\* 100%).**



### **3. Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej” przeprowadziła w trybie przetargu nieograniczonego trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona w dniu 19.03.2008r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 12.357.405,23 zł netto, co stanowiło równowartość 3.187.280,50 EURO.

Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej nr 33/2008 z dnia 19.03.2008r. powołana została 6-osobowa komisja przetargowa, której tryb pracy określono w załączonym do decyzji regulaminie.

Z przedstawionych przez Zamawiającego dokumentów wynika, że pierwsze postępowanie – znak sprawy PT-2370/3/08 – wszczęte w dniu 07.04.2008r. (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 69749-2008 oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń) zostało unieważnione w dniu 29.04.2008r. na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy, w związku z faktem, iż nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Z przeprowadzonego postępowania w dniu 29.04.2008r. sporządzono protokół wraz z załącznikami.

Ustalono, iż Zamawiający w dniu 30.04.2008r. ponownie wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 90856-2008 w dniu 30.04.2008r. oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie – znak sprawy PT-2370/4/08. Do postępowania przystąpiło 5 firm, które przedłożyły swoje oferty. Najkorzystniejszą ofertę, na podstawie przyjętych przez Zamawiającego kryteriów ich oceny, tj. ceny o znaczeniu 100%, przedstawił Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias, 28-238 Rytwiany ul. Klasztorna 18 na kwotę 13.218.535,95 zł brutto. W związku z faktem, iż powyższa oferta przekraczała środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji, tj. 12.500.000,00 zł brutto, postępowanie zostało ponownie unieważnione, w myśl przepisów art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy. Z przeprowadzonego postępowania sporządzono w dniu 20.06.2008r. protokół wraz z załącznikami.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano dokumentację z przeprowadzonego trzeciego postępowania, w wyniku którego został wybrany wykonawca

robót w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej” – znak sprawy PT-2370/14/08, tj.:

1. Wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej z dnia 30.07.2008r. skierowany do Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej o ponowne wszczęcie postępowania.
2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.07.2008 r. pod nr 177509-2008, oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.straz.kielce.com.pl](http://www.bip.straz.kielce.com.pl).
3. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 30.07.2008r., w której uwzględniono wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:
  - termin składania ofert – 21.08.2008r. na godz. 9.<sup>00</sup>,
  - kryterium oceny ofert – najniższa cena – cena o znaczeniu 100%,
  - wymóg wniesienia wadium w kwocie 150.000,00 zł,
  - termin wykonania zamówienia na dzień 31.12.2011r.,SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.straz.kielce.com.pl](http://www.bip.straz.kielce.com.pl).
4. Zapytania złożone w trakcie postępowania w dniu 13.08.2008r. przez zainteresowanego oferenta dotyczące przedmiotu zamówienia.
5. Odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania przesłano do oferenta w dniu 14.08.2008r. oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Oferty złożone w wymaganym terminie, tj. w dniu 21.08.2008r.:
  - oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „DORBUD” S. A., 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 153, na kwotę 12.476.999,79 zł brutto;
  - oferta nr 2 – SAMSON Sp. z o.o., ul. Spokojna 22, 33-100 Tarnów, na kwotę 10.955.398,50 zł brutto;
  - oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o. o., ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów, na kwotę 12.324.295,48 zł brutto;
  - oferta nr 4 – Konsorcjum firm: ADMA Zakład Remontowo-Budowlany, ul Kościuszki 68, 28-200 Staszów – lider, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ADMA Sp. j. ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów – partner, na kwotę 13.923.592,86 zł brutto;
  - oferta nr 5 – „WIKAR” Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe, 33-314 Łosina Dolna 108, , na kwotę 17.557.519,87 zł brutto;


7. Wezwanie z dnia 21.08.2008r. do uzupełnienia brakujących dokumentów (aktualne zaświadczenie US oraz ZUS) do dnia 26.08.2008r. skierowane do SAMSON Sp. z o.o.
8. Pismo oferenta z dnia 22.08.2008r. przekazujące w załączeniu wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
9. Informacja z dnia 25.08.2008r. skierowana do wszystkich oferentów o poprawieniu w jednej z ofert (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o. o.) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, na podstawie art. 88, ust. 1 lit. a ustawy.
10. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.08.2008r., zawierający m.in.:
  - Opis przedmiotu zamówienia oraz jego szacunkową wartość;
  - Informację o otwarciu ofert, które odbyło się w dniu 21.08.2008 r. o godz. 9.<sup>30</sup> w siedzibie Zamawiającego;
  - Informację dotyczącą kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 12.000.000,00 zł brutto;
  - Oświadczenia osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika Zamawiającego – druk ZP-11;
  - Zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12;
  - Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – druk ZP-17 – 5 wykonawców;
  - Karty indywidualnej oceny ofert – druki ZP-20;
  - Streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21, zgodnie z którym oferta nr 5 – SAMSON Sp. z o.o., ul. Spokojna 22, 33-100 Tarnów, na kwotę 10.955.398,50 zł brutto zł – została oceniona jako najkorzystniejsza;
  - Informację o wniesionych protestach i odwołaniach druk ZP-22 – w trakcie postępowania nie wniesiono protestów ani odwołań;
11. Zawiadomienie z dnia 28.08.2008r. o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na stronie internetowej [www.bip.straz.kielce.com.pl](http://www.bip.straz.kielce.com.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 219206-2008.
13. Umowa nr PT-2370/14/2008 zawarta w dniu 09.09.2008 r. pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, a firmą SAMSON Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na kwotę 10.955.398,50 zł brutto na realizację

przedmiotowego zamówienia, którego termin zakończenia określono w §3 umowy do dnia 31.12.2011r.

[Dowód: akta kontroli karty: 31-258]

#### 4. Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu pn. „Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej”.

W trakcie przeprowadzonej kontroli potwierdzono fizyczną realizację projektu zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.

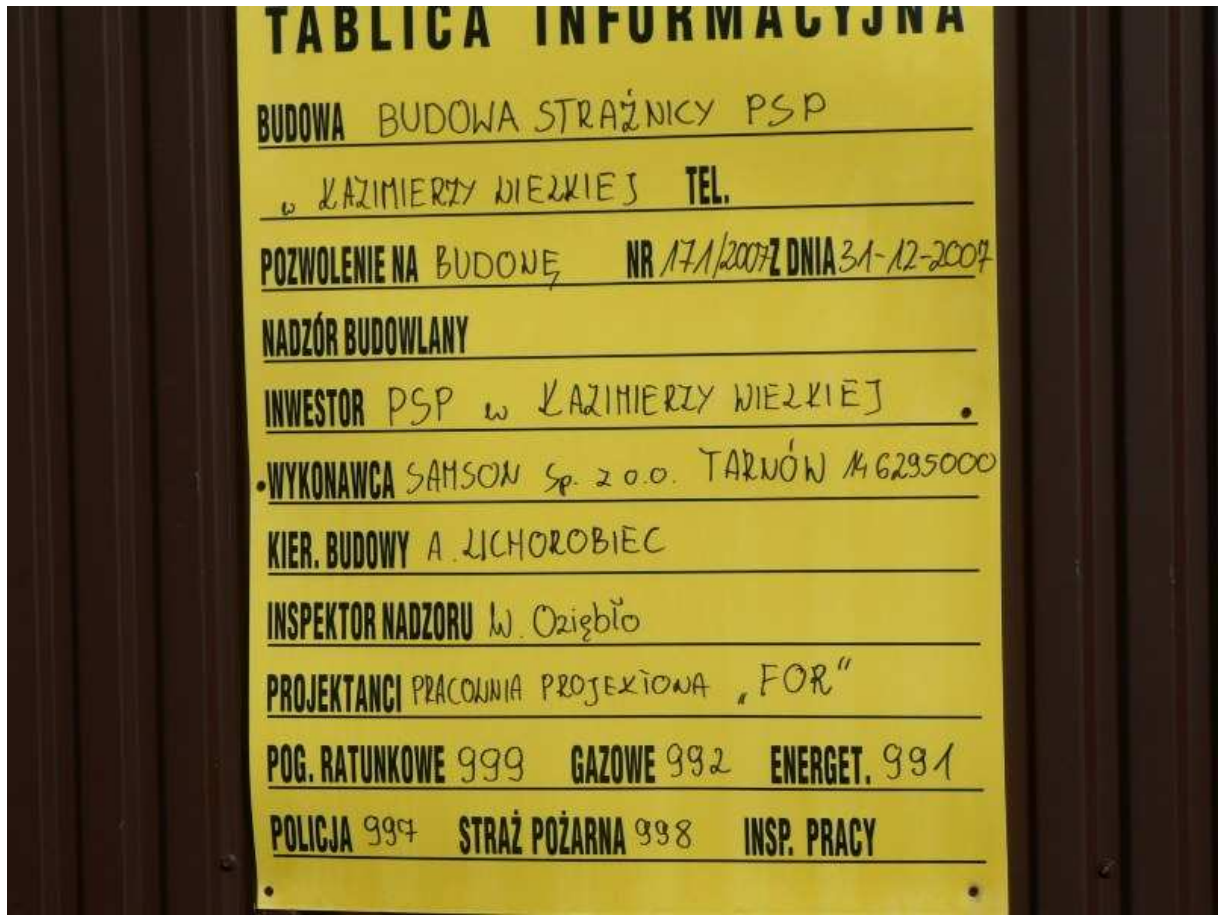


**Fot.1** Tablica informacyjna prowadzonej inwestycji w Kazimierzy Wielkiej



**Fot.2** Kompleksowa realizacja inwestycji – wykonawca – „Samson sp. z o.o.” - „Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej”



**Fot.3** Wejście od strony głównej, ulicy Kolejowej – PSP Kazimierza Wielka.

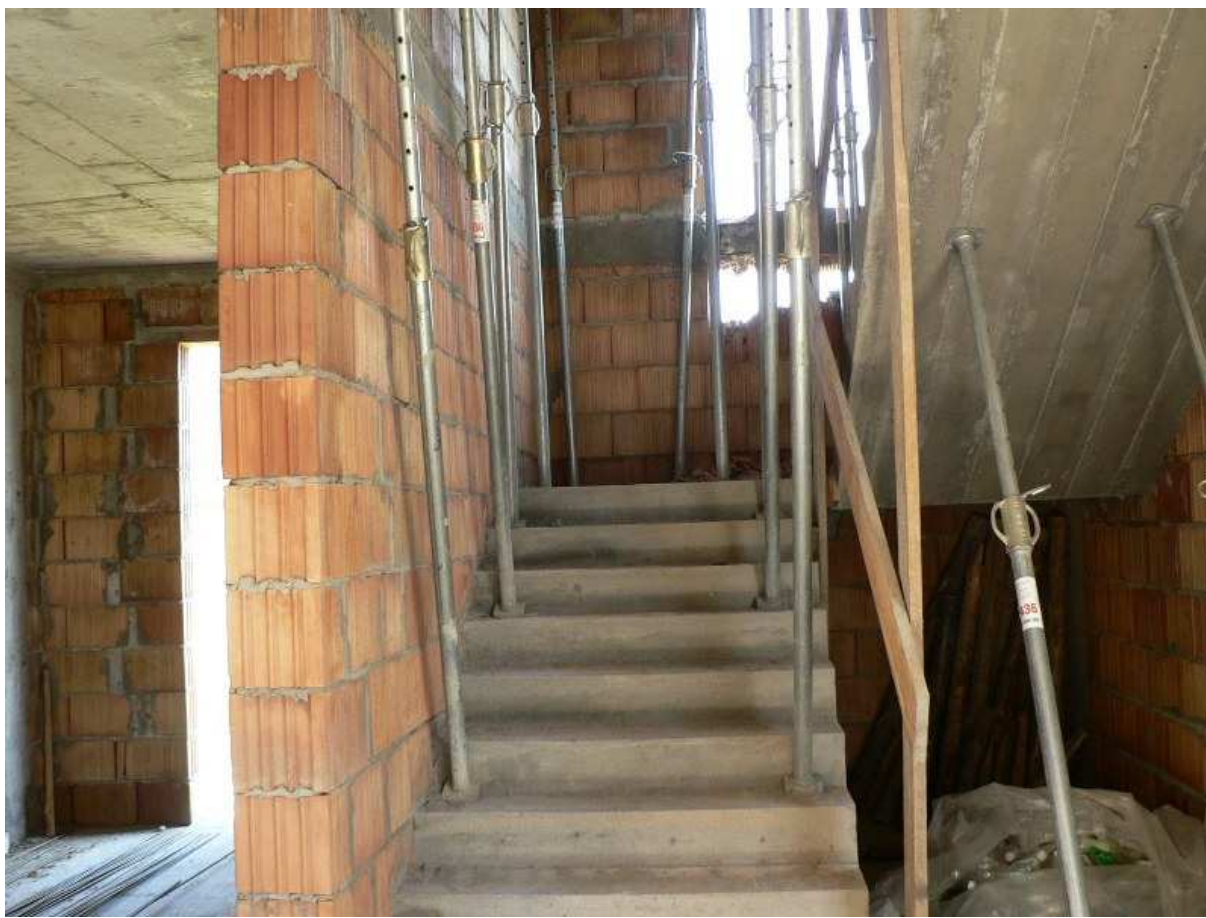

**Fot.4** Schody na piętro, gdzie przewidziane są pomieszczenia administracyjne – PSP Kazimierza Wielka.





**Fot. 5** Garaż z kanałem rewizyjnym – PSP Kazimierza Wielka.



**Fot. 6** Pomieszczenia garażowe – PSP Kazimierza Wielka.



**Fot.7** Pomieszczenia szatniowo – sanitarne – PSP Kazimierza Wielka.



**Fot. 8** Widok pomieszczeń garażowych – PSP Kazimierza Wielka.



**Fot.9** Widok budynku od strony drogi ulicy Kolejowej. (wizualizacja) – PSP Kazimierza Wielka.



**Fot.10** Widok pd-zach od strony Firmy Rolmet. (wizualizacja) – PSP Kazimierza Wielka.



**Fot.11** Widok tył budynku strażnicy część pn. – wsch. (wizualizacja) – PSP Kazimierza Wielka.



**Fot.12** Widok wschodni budynku strażnicy od strony firmy Morris (wizualizacja) – PSP Kazimierza Wielka.



### **Wnioski z kontroli:**

1. Kontrolowane dowody finansowo – księgowe były tożsame z ujętymi w złożonym i zweryfikowanym, przedłożonym do rozliczenia wydatkowaniu środków przeznaczonych na inwestycję. Uwzględniono także fakturę na rok 2010.
2. Zakres rzeczowy inwestycji pn. „Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej” jest w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane na 2011 rok.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli PSP Kazimierza Wlk. w roku 2010 pod poz. 5.

**Pouczenie:**

Na podstawie art. 44 pkt. 3 i 4 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009r. ( Dz. U. Nr 31, poz. 206 ) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej winien wysłać podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotować w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysłać je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej,
2. Wojewoda Świętokrzyski.

Data .....22.11.2010 r.

Data ...26.11.2010 r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Jolanta Rybka
2. Beata Jakubowska
3. Emilia Machul – Frelik
4. Radosław Kowalski

1. bryg. mgr inż. Mirosław Ciepela  
Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożnej

